



Baustellen Newsletter 06/2026

Liebe Baustellenfans

Gerne informiere ich Euch über den aktuellen Stand unserer Baustelle.

In den vergangenen Wochen konnten weitere wichtige Arbeiten umgesetzt werden:

Dacharbeiten Rosenhaus

Beim Rosenhaus wurden die Dachziegel entfernt sowie die bestehende Isolation zurückgebaut und fachgerecht entsorgt. Im Anschluss erfolgte die Prüfung der Dachbalkenkonstruktion.





Notwendige Verstärkungen der Dachbalken wurden vorgenommen. Der Dachstock befindet sich mittlerweile in einem weit fortgeschrittenen Zustand.



Treppenhaus

Das Fundament für das Treppenhaus ist vorbereitet. Zudem wurde die Schalung für das Treppenhaus erstellt.

Baufortschritt allgemein

Der aktuelle Baufortschritt liegt rund drei Wochen vor dem geplanten Zeitplan. Anpassungen am Gerüst wurden vorgenommen, und ein überdimensionales Werbeplakat wurde angebracht.



Weitere ausgeführte Arbeiten

Der Kamin wurde entfernt. Die Betonierarbeiten für das Fundament des Lifts im Schwanenhaus sowie für die Treppe im Rosenhaus sind abgeschlossen.

Das Sonnensegel wurde montiert und in Betrieb genommen.

Am Rosenhaus ist der Dachgiebel inklusive Balkenkonstruktion fertiggestellt. Die Schutzplane wurde entfernt, Dämmplatten wurden montiert und anschliessend mit einer Schutzfolie abgedeckt. Der Durchgang zwischen Rosenhaus und Schwanenhaus wurde mit Balken versehen.



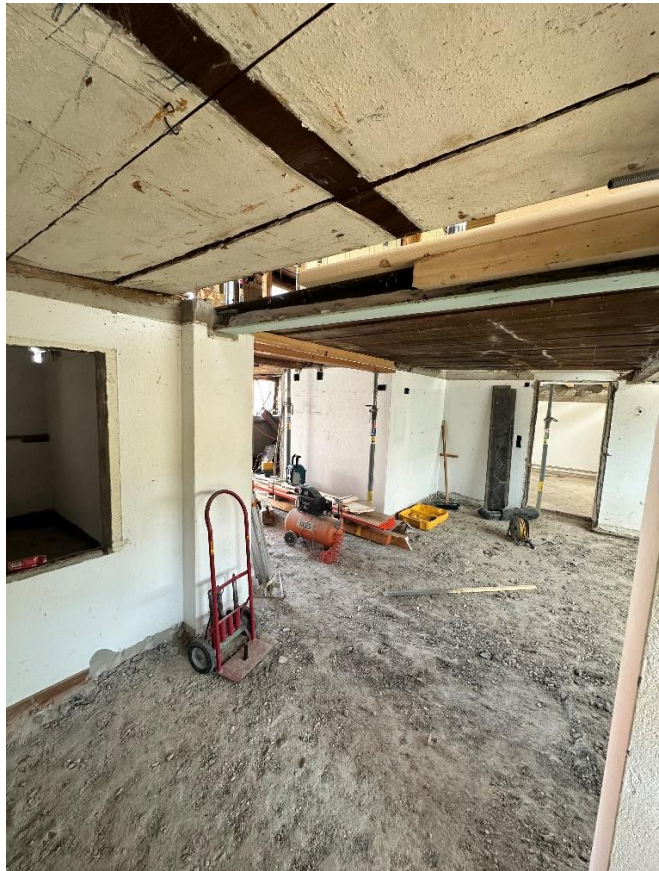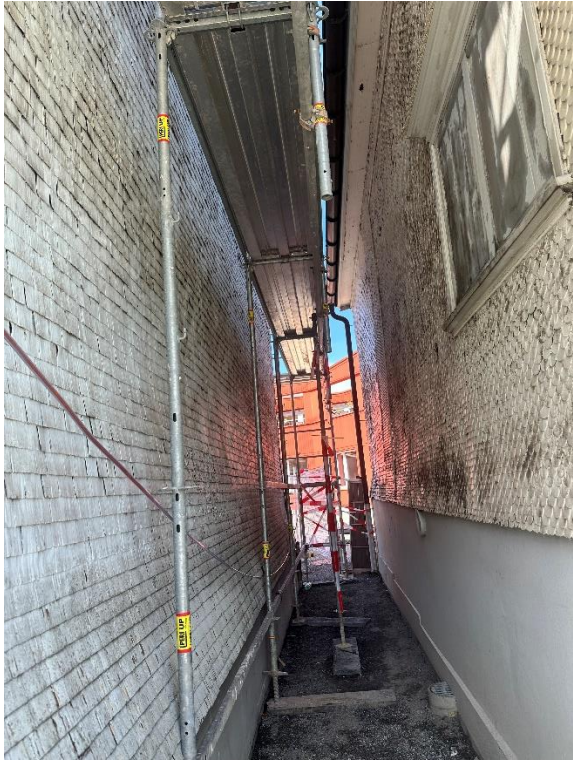



Ausblick auf die nächsten Wochen

In den kommenden Wochen sind folgende Arbeiten geplant:

Das Dach wird neu mit Dachziegeln eingedeckt, in einer Optik analog zum Sonnenhaus.
